

令和3年度 通学路点検対策箇所一覧

【市町村報告用】

| | |
|---|---|
| 1 | 見通しのよい道路や幹線道路の抜け道になっている道路など車の速度が上がりやすい箇所、 大型車の進入が多い箇所 |
| 2 | 過去に事故に至らなくてもヒヤリハット事例があった箇所 |
| 3 | 保護者、見守り活動者、地域住民等から市町村への改善要請があった箇所 |


| チェック欄 | No. | 小学校区 | 通学路の危険・要注意箇所 | 目印 | 状況の概要 | 新規・継続 | 観点 (交通安全/防犯/防災) | 教育 | | | 警察 | | 道路管理者 | | その他対策者 | | 道路管理者が対策する場合 | | | | | | | | |
|-------|-----|------|--------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------|--------|--------|-----|------|----------|------------|----------------|-------------|-----|--------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-----|-----|----|----|--|
| | | | | | | | | 対策内容 | 通学路変更 | 進捗 | 対策内容 | 進捗 | 対策内容 | 進捗 | 対策内容 | 進捗 | 対策者 | 路線名 | 施工規模 | 着手(予定) | 完了 | | | | |
| | 1 | 豊洋小 | 国道213号線沿い歩道 | 「奈多八幡」のバス停 | 歩道の幅が狭く、草も茂っており危険。 | 新規 | 交通安全 | 登下校の指導 | | 実施中 | | | 防草コンクリート施工 | 未着手 | | | 県 | 国道213号線 | 防草コンクリート | R3 | 10月 | R4 | 4月 | | |
| | 2 | 豊洋小 | 国道213号線沿い歩道 | 幼稚園から国東方面歩道 | 歩道に草が茂っている。 | 新規 | 交通安全 | 登下校の指導 | | 実施中 | | | 防草コンクリート施工 | 完了 | | | 県 | 国道213号線 | 防草コンクリート | R2 | 10月 | R3 | 3月 | | |
| | 3 | 護江小 | 美濃崎線 | 守江 ※日向屋前～R213 | 歩道の白線が消えている。 | 新規 | 交通安全 | 登下校の指導 | | 実施中 | | | 外側線の施工を検討 | 未着手 | | | 市 | 美濃崎線 | L=520m(両側) | R3 | 12月 | R4 | 3月 | | |
| | 4 | 護江小 | 美濃崎線 | 住吉橋 | 橋の横にすきまがある。 | 継続 | 防災 | 安全指導 | | 実施中 | | | | 転落防止柵を設置 | 未着手 | | 市 | | | | | | | | |
| | 1 | 5 | 護江小 | 野辺平河原線 | 野辺 ※デンケン | スピードを出す車が多い。 | 継続 | 交通安全 | 登下校の指導 | | 実施中 | | | | 立て看板を設置する | 未着手 | | 市 | | | | | | | |
| | 1 | 6 | 護江小 | 国道213号線沿い歩道 | 灘手 ※ティスリーマイカー | スピードを出す車が多い 自転車と離合時危険 | 継続 | 交通安全 | 登下校の指導 | | 実施中 | | | 現地調査のうえ対応を検討 | 未着手 | | | 県 | 国道213号線 | ガードパイプ設置 | R3 | 10月 | R4 | 3月 | |
| | | 7 | 大内小 | 浜篠原線 | 大内公民館から新興に向かう道路(坂道) | 道路が狭く、崖崩れのおそれもあり。 | 継続 | 防災 | 安全指導 | | 実施中 | | | 法面点検実施 | 実施中 | | | 市 | 浜篠原線 | 法面点検 | R1 | 10月 | | | |
| | 1 | 8 | 東小 | 片野三川線 | 片野区～三川区の旧道 ※絆商店～健康福祉C | 見通しが悪く道幅も狭い スピードを出す車が多い | 継続 | 交通安全 | 登下校の指導 | | 実施中 | | | | 立て看板を設置する | 未着手 | | 市 | | | | | | | |
| | 3 | 9 | 杵築小 | 北浜西新町線 谷町北台線 | 学校校門前変則交差点及び 軒屋の坂上・幼稚園前の市道 | スピードを出す車が多い。 | 継続 | 交通安全 | 登下校の指導 | | 実施中 | 交通取り締まり | 実施中 | 交差点表示の施工 | | | 市 | 北浜西新町線 谷町北台線 | 交差点表示 (赤枠設置) | H31 | 2月 | H31 | 2月 | | |
| | 2 | 10 | 杵築小 | 北浜線 | 番所の坂に向かう市道の 高架下から交差点 | 道幅が狭い。 | 継続 | 交通安全 | 登下校の指導 | | 実施中 | | | グリーンベルトと外側線の施工 | 未着手 | | | 市 | 北浜線 | 外側線(L=40m) グリーンベルト延長 | R3 | 12月 | R4 | 3月 | |
| | 1 | 11 | 杵築小 | 北浜西新町線 | 学校校門から直進する北台の市道 | 道幅が狭く、車の交通量が多い。 | 継続 | 交通安全 | 登下校の指導 | | 実施中 | | | グリーンベルトを検討 | 未着手 | | | 市 | 北浜西新町線 | グリーンベルト設置 (未定) | | | | | |
| | | 12 | 杵築小 | 今村旧祇園駅線 | 守未交差点付近の「五差路」 ※江藤整骨院 | 道幅が狭く、交通量も比較的 多い。 | 継続 | 交通安全 | 登下校の指導 | | 実施中 | | | 交差点改良の計画を検討 | 未着手 | | | 市 | 今村旧祇園駅線 | 交差点改良 施工時期未定 | | | | | |
| | | 13 | 杵築小 | 本町田平線 | 杵築郵便局前道路T字路 | 左右の安全確認が難しい。 | 新規 | 交通安全 | 登下校の指導 | | 実施中 | 道交法遵守を指導 | 実施中 | | | | | 市 | | | | | | | |
| | | 14 | 杵築中 | 国道213号線沿い歩道 | 灘手:元禄うどんから安岐方面の山側カーブ | 雑草が茂り、自転車の通行が車道側に限られる。 | 継続 | 交通安全 | 登下校の指導 | | 実施中 | | | 防草コンクリート施工 | 完了 | | | 県 | 国道213号線 | 防草コンクリート | R2 | 10月 | R3 | 3月 | |
| | 2 | 15 | 杵築中 | 国道213号線沿い歩道 | 高山橋～ジョイフル間横断歩道 | 横断歩道を通過する際確認が難しい。 | 新規 | 交通安全 | 登下校の指導 | | 実施中 | | | 防草コンクリート施工 | 未着手 | | | 県 | 国道213号線 | 防草コンクリート | R3 | 10月 | R4 | 3月 | |
| | | 16 | 山香小 | 山香院内線 | 山香病院を下った十字路 | 通学路であり、朝夕の交通量が多い。 | 継続 | 交通安全 | 登下校の指導 | | 実施中 | | | 道路改良工事中 | 実施中 | | | 県 | 山香院内線 | 歩道設置 | | | R4 | 3月 | |
| | | 17 | 山香小 | 佐田線 | 若宮駅前通り | 白線が消えたり、薄くなったりしている。 | 継続 | 交通安全 | 登下校の指導 | | 実施中 | | | 外側線の施工検討 | 未着手 | | | 市 | 佐田線 | 外側線設置 (L=360m) | R3 | 12月 | R4 | 3月 | |
| | | 18 | 立石小 | 国道10号線 | 国道10号線:学校から藤田信号機間の上り側 | ガードレールが設置されていない箇所がある。 | 継続 | 交通安全 | 登下校の指導 | | 実施中 | | | ガードレールの設置を検討 | 未着手 | | | 国 | 国道10号線 | ガードパイプ設置 | R3 | 9月 | R4 | 3月 | |
| | | 19 | 立石小 | 国道10号線 | 国道10号線:学校から延隆寺までの上り側 | ガードレールが設置されていない箇所がある。 | 継続 | 交通安全 | 登下校の指導 | | 実施中 | | | ガードレールの設置を検討 | 未着手 | | | 国 | 国道10号線 | ガードパイプ設置 | R3 | 9月 | R4 | 3月 | |
| | | 20 | 大田小 | 沓掛石丸線 | 下沓掛・東平2地区道路沿いの倉庫 | 強風が吹くとタン板や屋根材が飛んできそう。 | 継続 | 防災 | 安全指導 | | 実施中 | | | | 市民生活課に対応を依頼 | 未着手 | | 市 | | | | | | | |
| | | 21 | 大田小 | 角石堀田川線 | 石丸・螢石橋付近から学校への通学路 | 水路が路面より下にあり深いため危険である。 | 継続 | 交通安全 | 登下校の指導 | | 実施中 | | | | 転落防止柵設置 | 未着手 | | 市 | | | | | | | |
| | | 22 | 大田小 | 県道山香国見線 | 野田橋付近の交差点 | 横断歩道がほとんど消えている状態、見えにくい。 | 継続 | 交通安全 | 登下校の指導 | | 実施中 | 再施工を検討 | 未着手 | | | | | 市 | | | | | | | |

令和3年度通学路点検対策箇所

杵築市全図



平成十七年十月

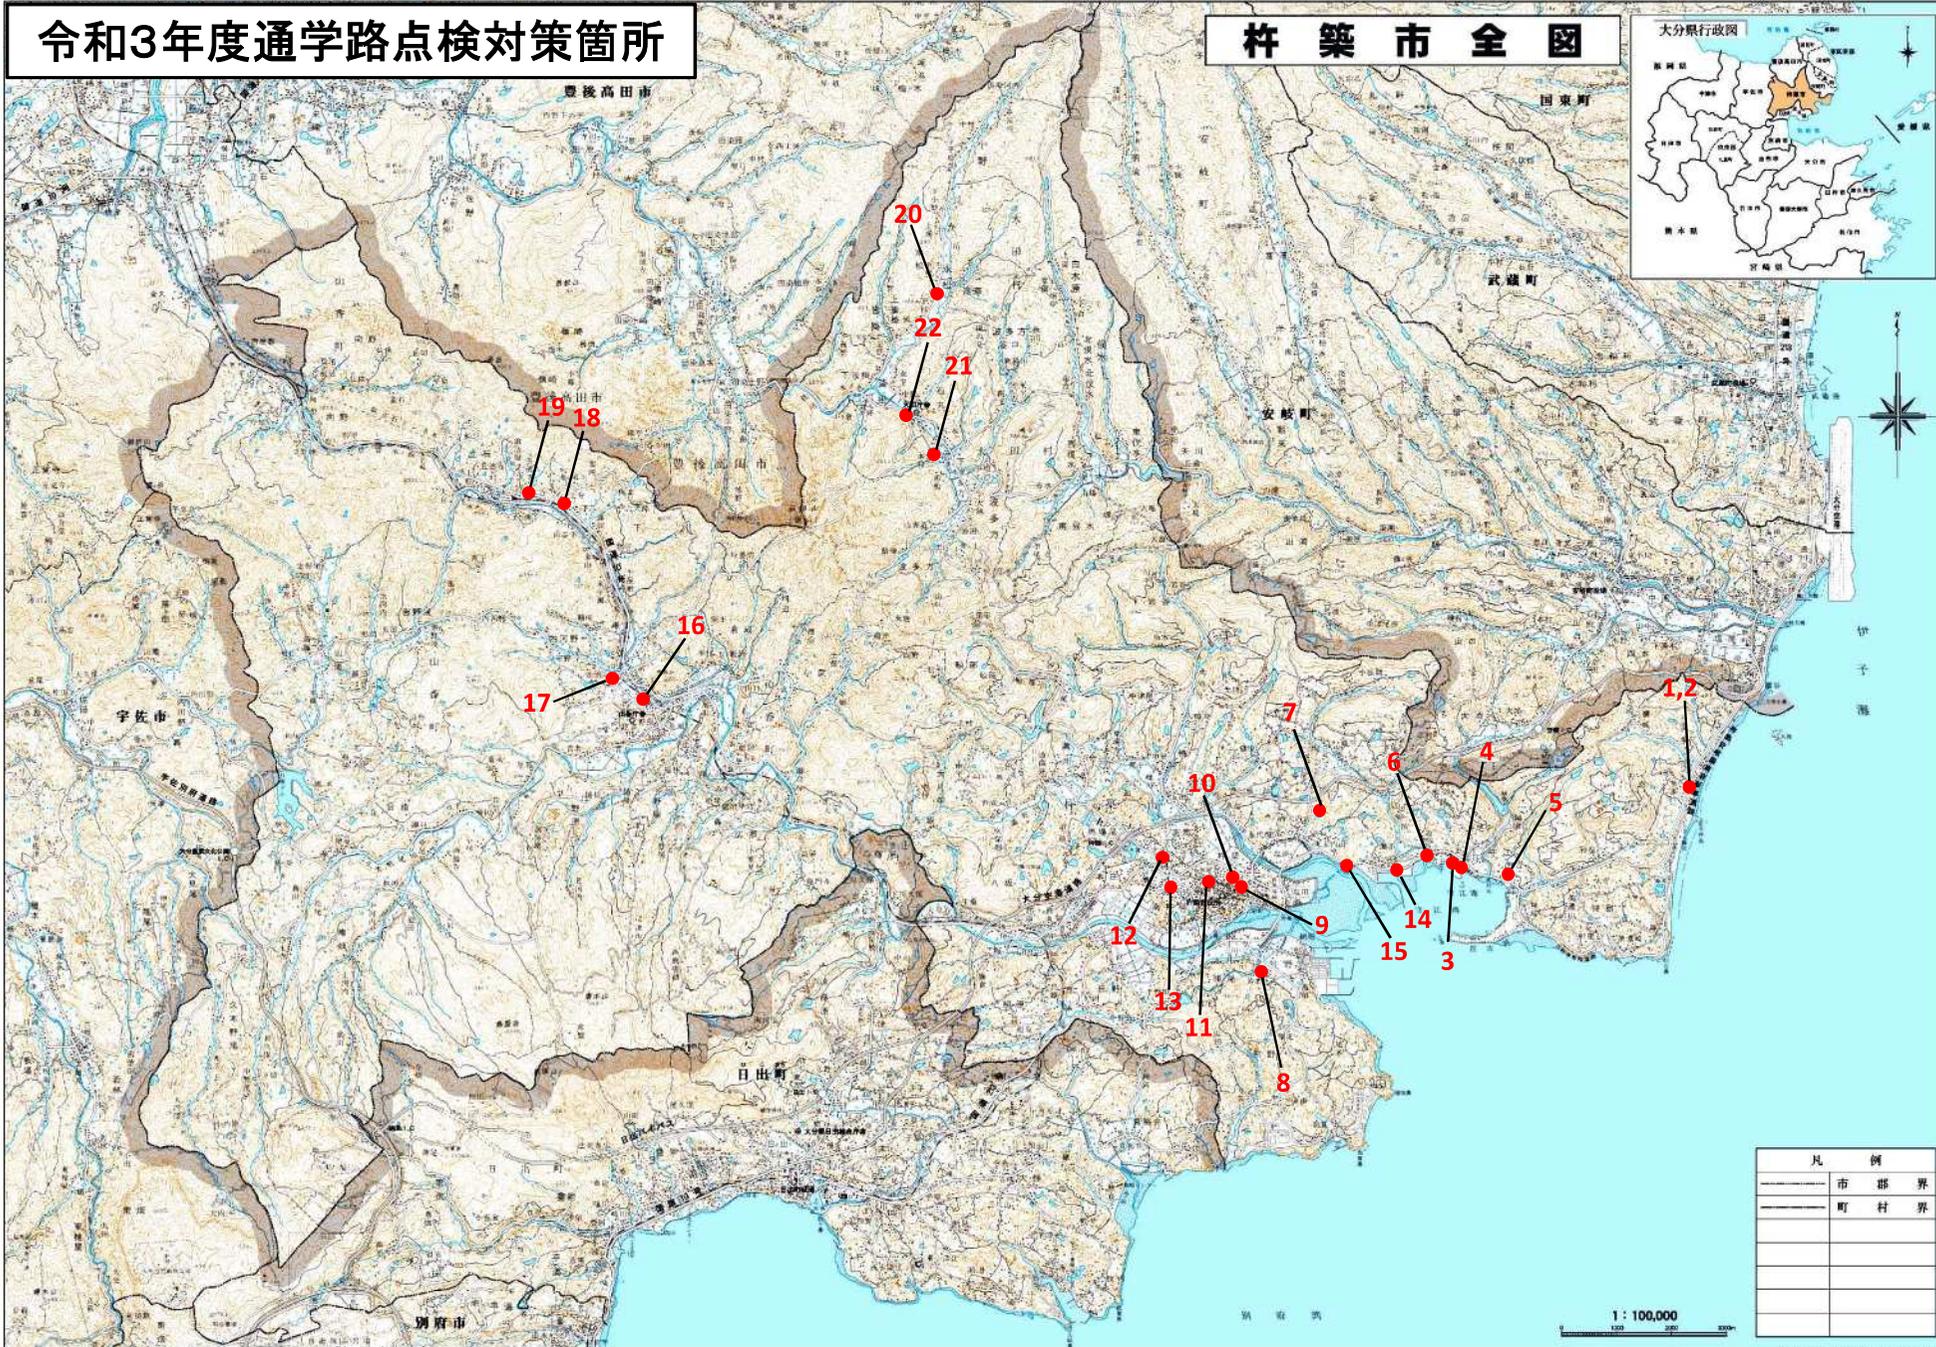

| 凡例 | |
|----|-----|
| | 市郡界 |
| | 町村界 |
| | |
| | |
| | |
| | |

1 : 100,000
0 100 200 300

〔この図は、国土交通省国土地理院から提供された地形図(25,000)を基に作成されたものであり、正確性を保証するものではありません。〕

製作：東海建設株式会社(0977)23-7188
2023.10.10現在
